


QUANTITATIVO DE PAINEIS E MONTANTES

FAMIGLIA	PANINI	MONTANTE	ed de profit	COMPOSICAO
PA-1	14	62	161,2	duplo chapa 12,5 + montante 48 e/ de 40 + duplo chapa 12,5
PA-2	1	6	28,6	duplo chapa 12,5 + perfil realista - montante 70 e/ de 90
PE-1	47	263	657,6	montante 38 + EPS 20 (ISO orig) + montante 66 e/ de 90 +
PE-1	6	35	80,6	gesso 12,5 + montante 90 e/ de 50 + gesso 22,5 + refector
Ph-1	9	16	41,6	gesso 12,5 + montante 70 e/ de 90 + gesso 12,5
TOTAL	71	368	956,6	



EXTRATO DA LISTA DE PAINEIS (26 de 71)

CODIGO	FAMILIA	LARG (mm)	ALT (mm)	MONT.	PAY
PF-001	PC-1	3000	2000	6	T
PF-002	PC-1	3000	2000	6	T
PF-003	PC-1	3000	2000	6	T
PF-004	PC-1	3000	2000	7	T
PF-005	PC-1	3000	2000	7	T
PF-006	PC-1	3000	2000	8	T
PF-007	PC-1	3000	2000	6	T
PF-008	PA-1	3000	2000	6	T
PF-009	PA-1	3000	2000	6	T
PF-010	PE-1	3000	2000	6	T
PF-011	PE-1	3000	2000	6	T
PF-012	PA-2	3000	2000	6	T
PF-013	PC-1	3000	2000	6	T
PF-014	PA-1	3000	2000	6	T
PF-015	PC-1	2100	2000	4	T
PF-016	PE-1	2100	2000	4	T
PF-017	PC-1	2400	2000	5	T
PF-018	PA-1	2600	2000	7	T
PF-019	PC-1	1800	2000	4	T
PF-020	PA-1	1200	2000	3	T
PF-021	PA-1	3000	2000	6	T
PF-022	PA-1	1100	2000	3	T
PF-023	PC-1	3000	2000	6	T
PF-024	PA-1	2400	2000	5	T
PF-025	PA-1	600	2000	2	T
PF-026	PA-1	2400	2000	5	T

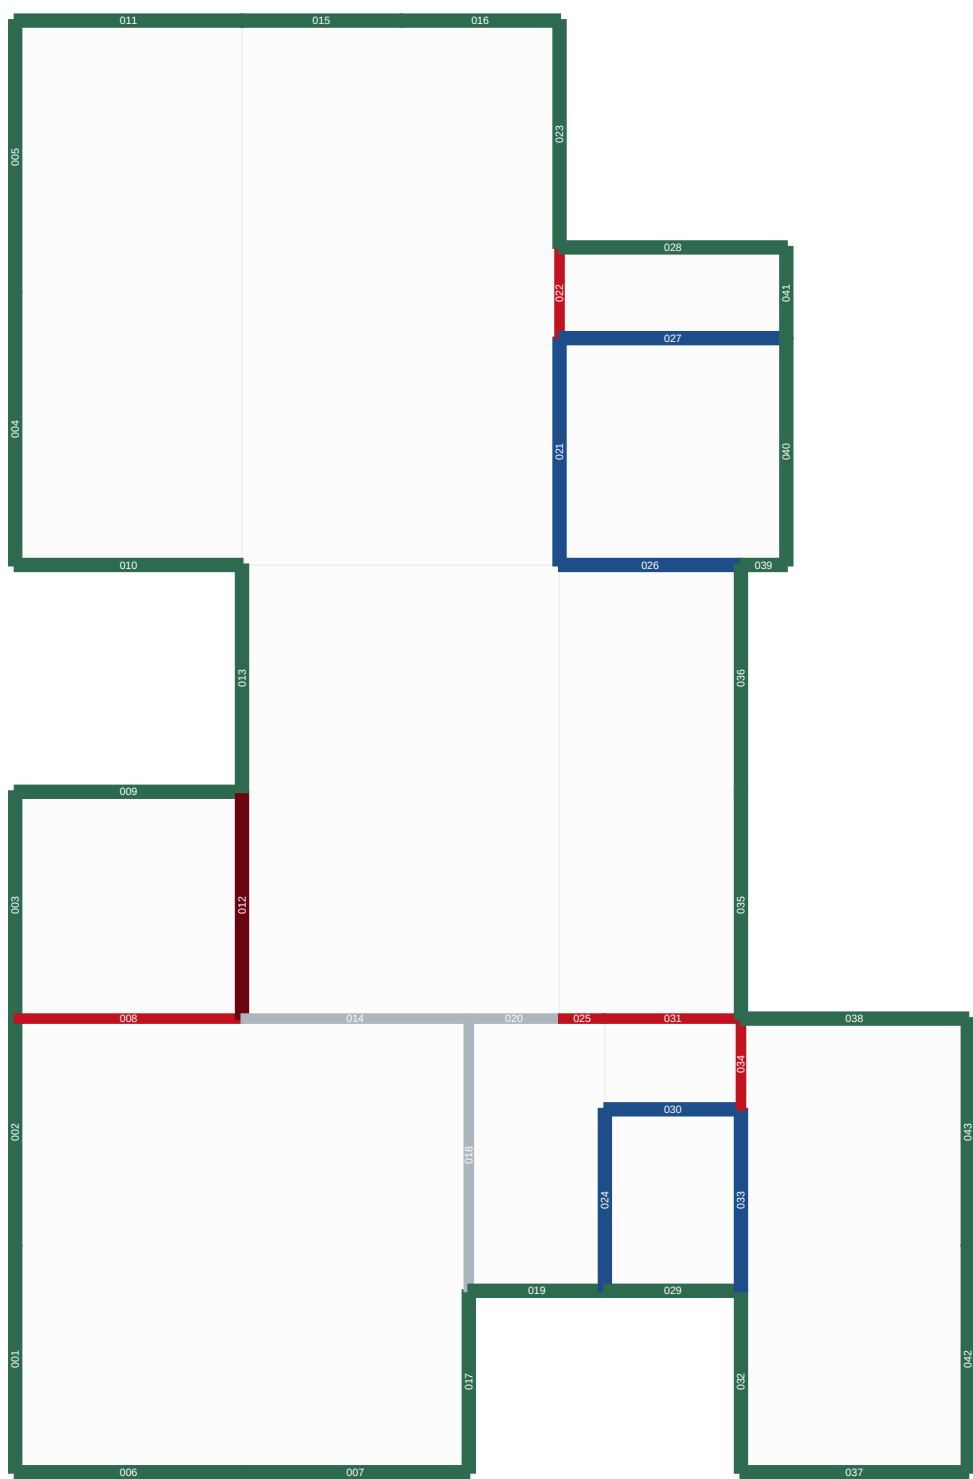

1 PAGINACAO — TERREO
ESCALA 1:100

NOTAS

- Painéis limitados a 3500 mm por manuseio e transporte.

- Montantes a cada 600 mm; 400 mm onde calcula ou revestimento exigido

- Nenhuma peça entra em nesting sem código, largura, altura, espessura, material e revisão.

- Numeracao por pavimento; a familia define a composicao interna do painel.

PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR | MANAUS - AM | SU16 TARUMA (H)

PROJETO ARQUITETÔNICO

PAGINACAO DE PAINES — LIGHT STEEL FRAME

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PIRACICABA
Lista Consolidada	1:100	ESTUDO PRELIMINAR R46	18
pos.#32 (previsto)	FORMATO A1	NÃO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE MESTRE: 144h	MALHA 600/800/150	SEM ART / INT	06 35 REV R46
