



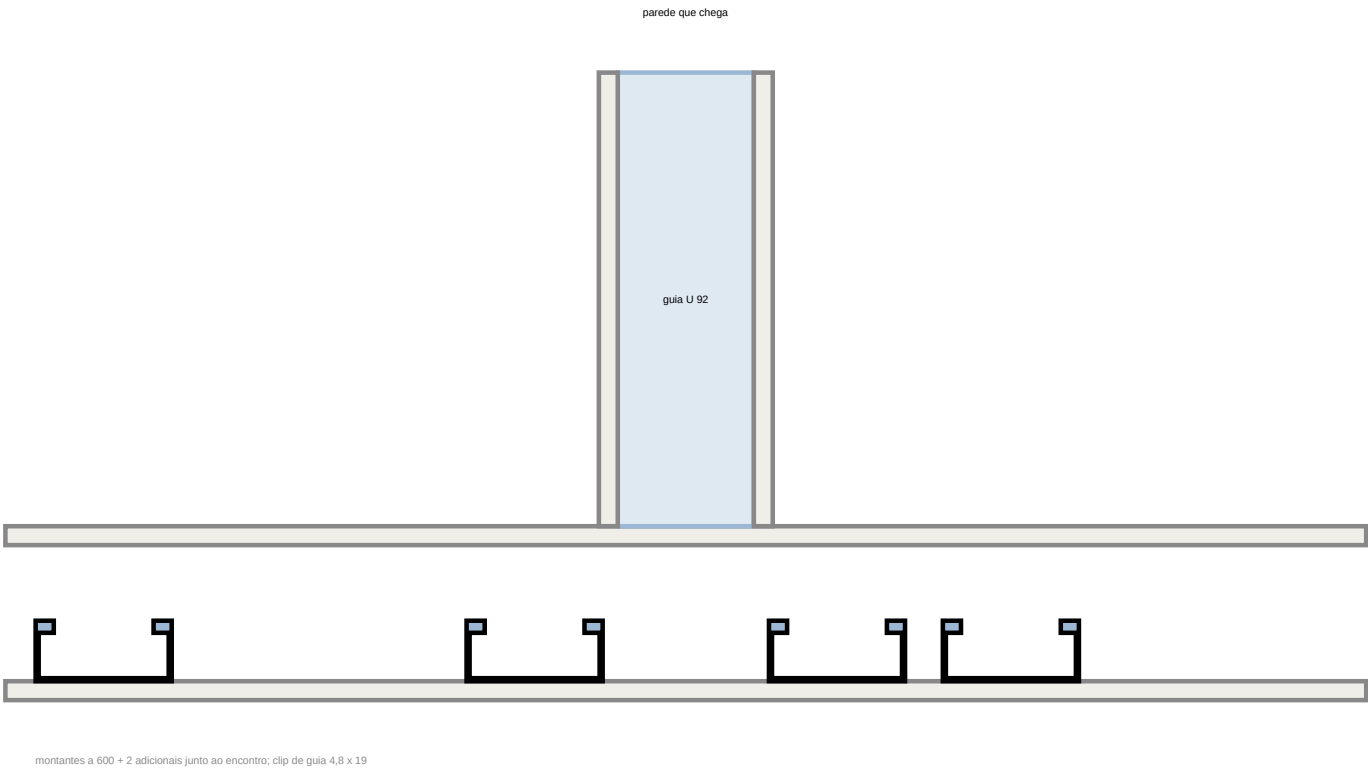


montante a 800 + 2 abscissas (uma no encontro, c/c da guia 6,3 x 1,9)


A ENCONTRO EM T — PLANTA
ESCALA 1:5

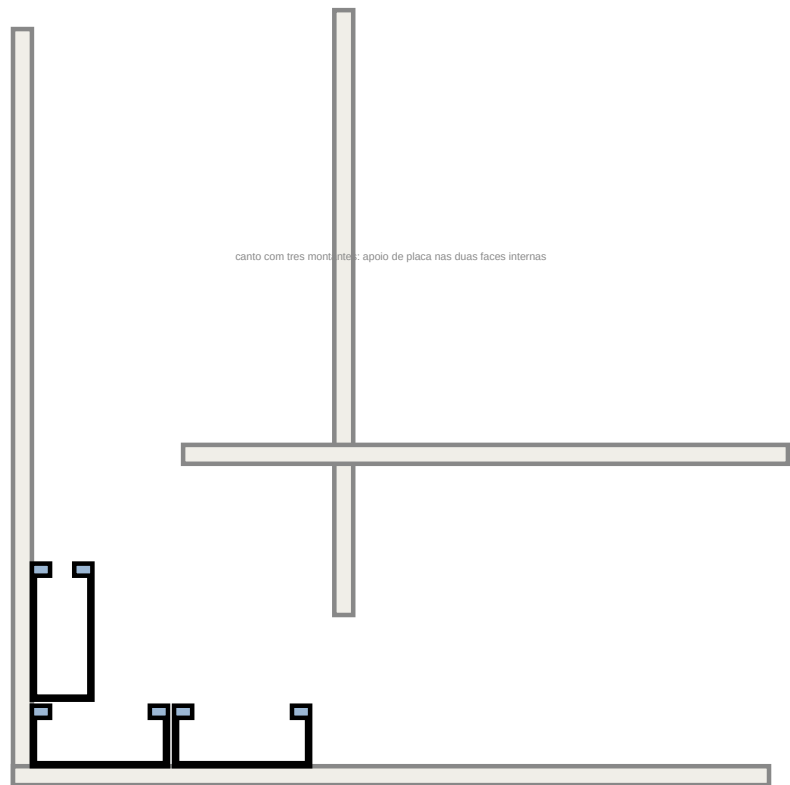


B CANTO EM L — PLANTA
ESCALA 1:5

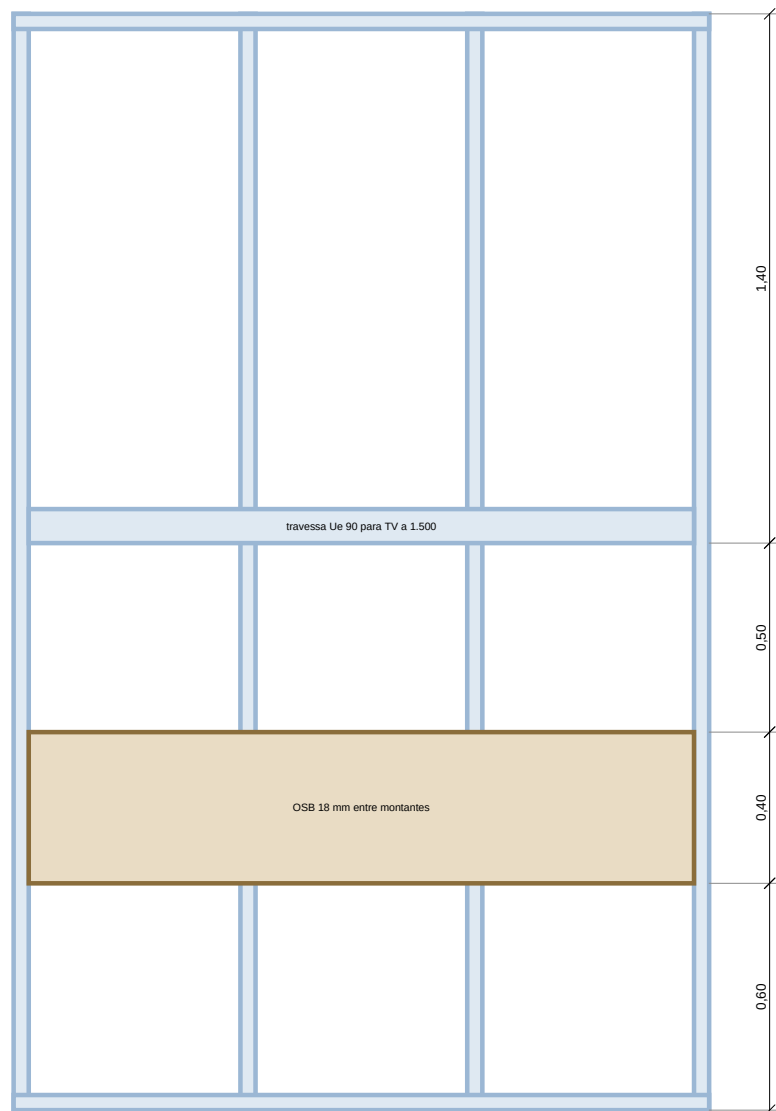

C REFORÇO PARA CARGA SUSPensa — ELEVACAO DA PAREDE
ESCALA 1:20

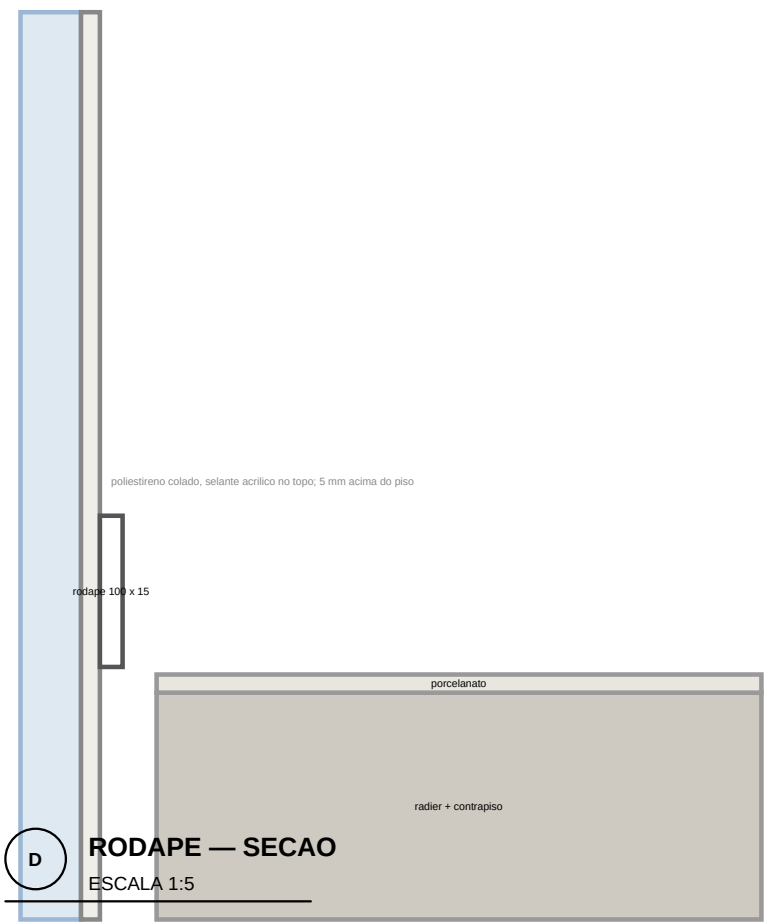

D RODAPE — SECAO
ESCALA 1:5



E JUNTA DE MOVIMENTACAO DE FACHADA — PLANTA (montante duplo)
ESCALA 1:5

CARGAS SUSPENSAS — ONDE E QUANTO

ITEM	Qtd	PARADA	Nº	PARADA	7 mm	MONI	Qtd/m²
LC-05-G	1.000	gabinete banho	90	V em 13000	600 13000	3	0.24
LC-05-G	1.000	gabinete banho	90	V em 13000	600 13000	3	0.28
LC-06-G	1.000	gabinete banho	90	H em 7000	600 13000	3	0.28
LC-06-G	1.000	gabinete banho	90	H em 9000	600 13000	3	0.28
LC-11-G	1.000	gabinete banho	90	H em 22000	600 13000	5	0.72
LV-03-P	1.000	panel tv	70	H em 13000	900 13000	5	2.52
LV-08-C	1.000	cabineira	25	V em 13000	300 13000	5	2.64
LV-08-C	1.000	cabineira	25	H em 13000	300 13000	5	2.64
LV-11-C	1.000	cabineira	25	V em 7000	300 13000	5	2.64
LV-11-C	1.000	cabineira	25	H em 22000	300 13000	5	2.64
LV-12-C	1.000	cabineira	25	H em 22000	300 13000	5	2.7
LV-03	1.000	tv	38	H em 13000	900 13000	4	0.96
LV-08	1.000	tv	38	H em 22000	900 13000	4	0.96

ENCONTROS EM T — 12

PAR	X	Y	CONTINUA	EXTERNA
T	8400	13000	H	rua
T	8400	13000	H	rua
T	10000	8600	H	rua
T	2400	13000	V	rua
T	9000	22000	V	rua
S	10000	22000	V	rua
S	7800	7200	H	rua
S	7800	15000	H	rua
S	13000	18000	H	rua
S	13000	18000	H	rua
S	7800	10000	V	rua
S	10000	13000	V	rua

NOTAS

- Encontro em T: 12 na casa, derivado das paredes (uma parede dentro de outra). Detalhe unico: montante adicional na parede continua, c/c da guia, 4 parafusos 4,8 x 1,5 por metro.
- Carga suspensa: 12 barras (gabinete de banho, gabinete de TV, cabineira e os dois TVs) localizados na parede que os recebe, refência de C/S 10 mm entre montantes na faixa de altura do item, 13,0 m2. Parede de LSF não segue bacia, segue montante e refência.
- Rodape: perfil de polietileno 300 x 15 sobre a placa, 5 mm acima do piso, selado, nos moldados, o próprio perfilado recortado (acabamento).
- Junta de movimentação de fachada: 40 (p/ cada 6 m e em cada canto), 10 mm com polietileno com barreira sobre montante duplo, placas não passam pela junta.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOUS TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

DETALHES DO LSF — ENCONTROS, CARGA SUSPensa, RODAPE E JUNTA DE FACHADA

BASE GEOMETRICA Linha Consolidada REV.02 (previsão) UNIDADE: METRO: mm	ESCALA 1:5 • 1:20 FORMATO: A1 MATERIAL: 60/60/60/60	EXATIDAO ESTUDO PRELIMINAR R12 NÃO LIBERADO PARA OBRA SEM ART / RNT	PROJETA 68 IN-TE REV.02
---	---	--	--------------------------------------
